



Розширена нарада з питань підготовки закладів освіти міста Києва до початку 2018-2019 навчального року


Розпорядження від 08.05.2018 №768 «Про підготовку закладів освіти комунальної форми власності територіальної громади міста Києва до початку 2018/2019 навчального року»



12 загальноміських програм

1 124,0

млн. грн.

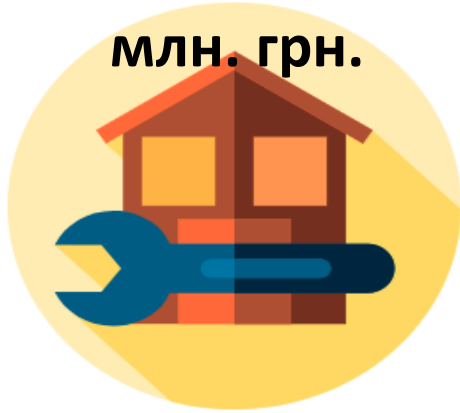

Освоєння коштів по всіх
програмах розпочато

2018 рік

ОСВОЄНО



101,4 млн. грн.
(9%)

ЩО ПЛАНУЄ МІСТО?

програми РДА

ЩО ВИКОНАНО?

станом на 01.06

ОСВОЄНО



Заміна вікон

69,9 млн. ₴ 19,0 млн. ₴ 27,2%



Придбання комп'ютерної техніки

17,1 млн. ₴ 3,0 млн. ₴ 17,4%



Новий освітній простір

132,2 млн. ₴ 19,5 млн. ₴ 14,7%



Підготовка до осінньо-зимового періоду

155,3 млн. ₴ 20,5 млн. ₴ 13,2%



Підготовка до 2018/2019 навчального року

270,0 млн. ₴ 25,0 млн. ₴ 9,3%



Ремонт спортзалів

28,6 млн. ₴ 1,7 млн. ₴ 6,1%

Найбільше – Шевченківський (100%)
Не розпочато – Дніпровський
Не передбачено – Голосіївський, Печерський

Найбільше – Дніпровський (63,7%)
Не розпочато – 5 (Дарницький, Деснянський, Печерський, Подільський, Солом'янський)
Не передбачено – 3 (Голосіївський, Оболонський, Шевченківський)

Найбільше – Шевченківський (51,8%)
Не розпочато – 4 (Дарницький, Деснянський, Оболонський, Святошинський)

Найбільше – Шевченківський (40,1%)
Не розпочато – Дніпровський
Не передбачено - Печерський

Найбільше – Шевченківський (40,1%)
Не розпочато – Дніпровський
Не передбачено - Печерський

Найбільше – Святошинський (13%)
Не розпочато – 4 (Дарницький, Деснянський, Солом'янський, Шевченківський)
Не передбачено – 4 (Голосіївський, Дніпровський, Печерський, Подільський)

ЩО ПЛАНУЄ МІСТО?

програми РДА

ОСВОЄНО

ЩО ВИКОНАНО?

станом на 01.06



Архітектурна
доступність до ЗО

42,1 млн. ₴

2,2 млн. ₴

5,3%



Дріб`язок

105,3 млн. ₴

3,5 млн. ₴

3,3%



Протипожежні
заходи

215,2 млн. ₴

5,0 млн. ₴

2,3%



Ігрові майданчики.
Ремонт та придбання

54,8 млн. ₴

0,7 млн. ₴

1,2%



Відновлення
груп у ЗДО

18,2 млн. ₴

1,0 млн. ₴

5,7%



Створення STEM
та STEAM - центрів

15,4 млн. ₴

0,3 млн. ₴

1,7%

Найбільше – Оболонський (27,3%)

Не розпочато – 6 (Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Святошинський, Солом`янський)

Найбільше – Печерський (14,3%)

Найменше – Подільський (0,2%)

Найбільше – Шевченківський (8,9%)

Не розпочато - Подільський

Найбільше – Святошинський (17,3%)

Не розпочато – 8 (Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Голосіївський, Солом`янський)

Найбільше – Деснянський (14,6%)

Не розпочато – 2 (Дніпровський, Святошинський)
Не передбачено – 5 (Голосіївський, дарницький, Печерський, Подільський, Солом`янський)

Найбільше – Дніпровський (13,4%)

Не розпочато – 6 (Дарницький, Деснянський, Подільський, Голосіївський, Солом`янський, Святошинський)

Не передбачено – 3 (Оболонський, Печерський, Шевченківський)

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

(СТВОРЕННЯ НОВОГО ОСВІТЬОГО СЕРЕДОВИЩА)



6,4
тис. грн.



ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

на 1 учня



2,0



- Дарницький – 1,9
- Святошинський – 2,2
- Оболонський – 2,9
- Печерський – 3,5
- Подільський – 4,1
- Деснянський – 4,3

на 1 учня



4,4



- Шевченківський – 7,0
- Солом'янський – 5,3
- Голосіївський – 5,1
- Дніпровський – 4,5

ТИС. €

Рейтинг освоєння коштів передбачених загальноміськими програмами

01.06
2018

1	Шевченківський	2
2	Оболонський	4
3	Святошинський	3
4	Подільський	4
5	Дніпровський	2
6	Деснянський	1
7	Голосіївський	4
8	Солом'янський	5
8	Дарницький	2
9	Печерський	4

31.05
2017

Створення додаткових місць у ЗДО

НОВОБУДОВИ
260 місць



Виконано
№ 315
(260 місць)

Триває
офрмлення
документації

ВІДНОВЛЕННЯ
НЕПРАЦЮЮЧИХ ЗДО
780 місць



Виконано (255 місць)
№ 179 (220 місць)
№ 48 (35 місць)



Заплановано **2225** місць
Вже створено на 04.06 **655** місць
29%

ВІДНОВЛЕННЯ
груп
705 місць



Виконано 7 груп
(140 місць)

№ 150 (1 група)
№ 667 (1 група)
№486 (3 групи)
НРЦ №6 (2 групи)

УФСІ
(інвестиції)
420 місць



Не виконано

У черзі перебуває
3236 дітей віком
від 3-х до 5-ти років

Будівництво та реконструкція

станом на 04.06

33СО

передбачено
593,2 млн.грн



Ж/М
Осокорки, 10,
1080 місць

Дарницький

II комплекс
№151

Голосіївський

з добудовою
№ 23

Деснянський

вже завершено станом

на стадії завершення

№ 486
45 місць

№ 179
220 місць

Подільський Святошинський

№ 48
35 місць

Печерський

№ 315
260 місць

Оболонський

ЗДО

№ 658
95 місць

Голосіївський


№ 652
210 місць

Дарницький

№ 260

Оболонський

№ 593
220 місць

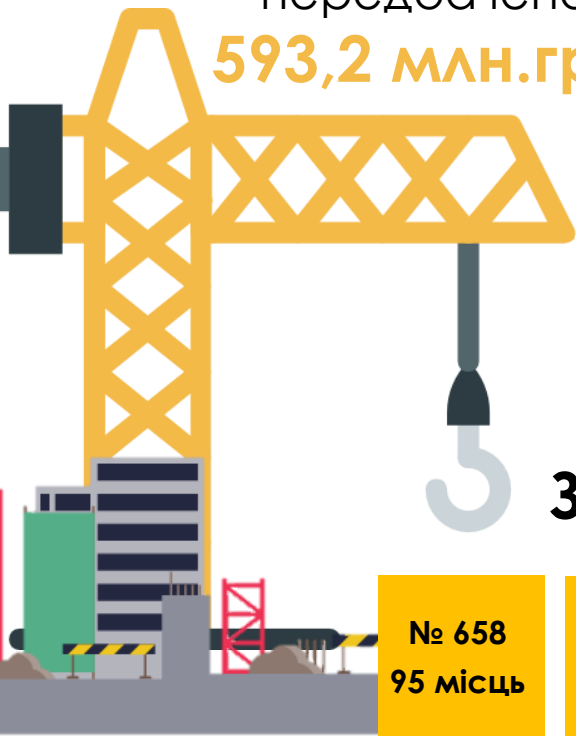

Термомодернізація 2018 (завершення)

- ЗДО № 221 (Голосіївський)
- ЗДО № 300 (Деснянський)
- ЗДО № 382 (Солом'янський)
- ЗДО № 431 (Шевченківський)



Індивідуальний тепловий пункт



Система вентиляції



Утеплення стін та цоколю



Утеплення покрівлі



Заміна дверей



Заміна вікон



- ЗЗСО № 316 (Дарницький)
- ЗЗСО № 200 (Святошинський)
- ЗДО № 584 (Подільський)
- ЗДО № 599 (Святошинський)



завершено станом на 01.06 **2** ЗДО:

№ 221 (Голосіївський)
№ 431 (Шевченківський)

на стадії завершення **2** ЗДО:

№ 300 (Деснянський)
№ 382 (Солом'янський)

ЗАПЛАНОВАНО

КП «ГВП»

ЗАПЛАНОВАНО

КП «Київбудреконструкція»

Проводимо

будівництво
футбольних полів
із штучним покриттям

66

Виконано

3

Розпочато на 17
майданчиках
Деснянського та
Оболонського
районів

КП «ЖИТЛО-СЕРВІС»

капітальний
ремонт

дитячих садків

88 закладів дошкільної
освіти

КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»

КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ»





2018

ПЕРШИЙ КЛАС

НУШ

Заплановано

Зараховано станом на 01.06

31 245 учнів



386

ЗЗСО



34 тис.

учнів



1,2 тис.

класів

У 65 школах - вільні місця
У 58 школах - жеребкування

У Реєстрі територіальної громади міста Києві зареєстровано **25,6** тис. дітей шестирічного віку.



Район	ЗЗСО, в яких є вільні місця станом на 01 червня		ЗЗСО, в яких з 5 по 10 червня відбудеться жеребкування	
	Кількість	Перелік ЗЗСО	Кількість	Перелік ЗЗСО
Голосіївський	6	№№ 21, 44, 87, 150, 236, 260	жеребкування не проводиться	
Дарницький	3	№№ 62, 266, 289	1	№№ 295
Деснянський	13	№№ 147, 152, 189, 192, 207, 212, 213, 218, 259, 275, 276, 300, 313	14	№№ 119, 202, 238, 247, 250, 251, 277, 282, 294, 306, 307, 308, 311, 322
Дніпровський	3	№№ 4, 180, 188	1	№ 148
Оболонський	1	№№ 104	6	№№ 8, 20, 29, 214, 216, 244
Печерський	6	№№ 75, 80, 88, 90, 94, 134	4	№№ 32, 56, 77, 79
Подільський	5	№№ 6, 10, 68, 114, 118	4	№№ 17, 19, 123, 243
Святошинський	2	№№ 205, 297	8	№№ 35, 50, 72, 154, 197, 215, 222, 235
Солом'янський	9	№№ 12, 46, 54, 60, 67, 69, 164, 174, 221	12	№№ 7, 26, 69, 115, 144, 149, 161, 173, 177, 279, 318, Політехнічний ліцей
Шевченківський	17	№ № 24, 25, 28, 41, 57, 58, 70, 82, 91, 95, 97, 101, 135, 138, 139, 163, 199	8	№№ 1, 38, 48, 57, 61, 73, 155, 175
Всього	65		58	
